




Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023;572 259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

Director General
Ing. Grigore FILIP

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES
pentru proiectul „Extinderea capacităților de fabricație și asamblare
aerostructuri destinate aviației civile” – cod SMIS 2592
pentru perioada 23.04.2012 – 22.07.2012

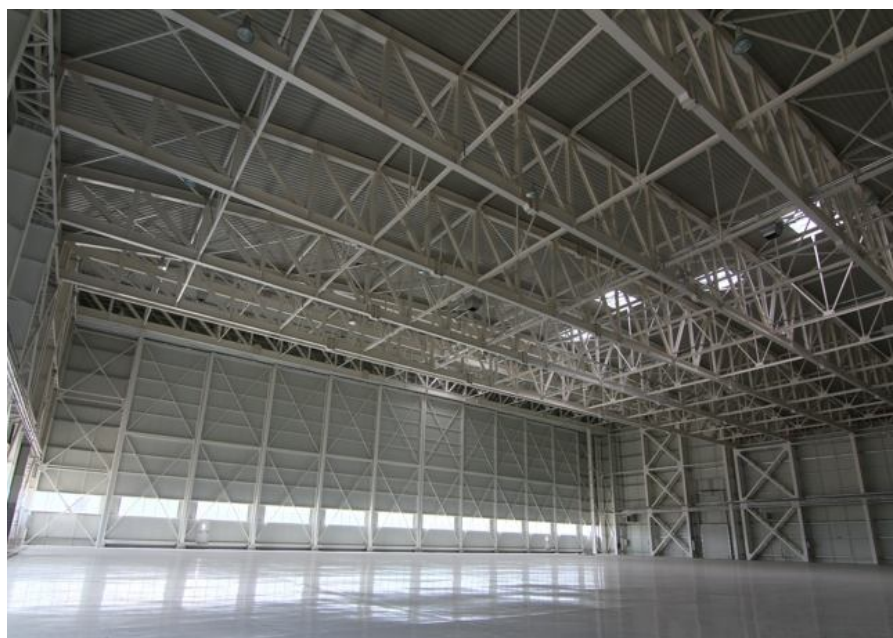

Manager de proiect
Dr.ing. Anton PAL

Elaborat,
Asistent Manager
Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Operațional Creșterea Competitivității Economice
Axa prioritară: Un sistem de producție inovativ și eco-eficient. Domeniul major de intervenție D.1.1. Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor
Operațiunea: Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile destinat întreprinderilor mari

1. Numărul Raportului de Progres 9 / 2012

2. Perioada de referință 23 Aprilie 2012- 22 Iulie 2012

3. Informații despre Beneficiar

Denumirea organizației S.C. AEROSTAR S.A.
Adresa str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România
Contact Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604
Ing. Andrei BOBOȘ, tel. 0234 575.070 int. 1392

Cod fiscal J04 / 1137 / 1991

4. Detalii despre proiect

Număr de referință SMIS 2592

Denumirea proiectului Extinderea capacităților de fabricație și asamblare de aerestructuri destinate aviației civile

Numărul Contractului de finanțare 210 304 / 22.04.2010

Locația geografică a proiectului:
(regiunea, zona, localitatea) N-E, jud. Bacău, mun. Bacău

5. Stadiul proiectului

De la data depunerii Raportului de Progres nr.7 și până la data depunerii prezentului Raport de progres s-au realizat următoarele activități:

Componenta 1

Achiziții de:

a) Mașini-unelte

- Livrare Mașină de frezat în 5 axe (DMU-100 mono Block). A fost recepționată în data de 01.06.2012 (7 săptămâni întârziere). A făcut obiectul contractului 959 / 13.09.2011 și s-au aplicat penalizări pentru întârziere conform art. 8 pct. 8.3 din Contract. Acestea se regăsesc în factura nr. 0040669 / 27.06.2012.
- Livrare mașină – Mașină de frezat CNC în 4 axe (Centru de prelucrare orizontal CNC de înalta precizie TOPPER HA-400 II). Punerea în funcțiune s-a realizat în data de 17.05.2012 (conform contract 957 / 05.09.2011 a necesitat probe complexe).

Componenta 2

Achiziții de:

b) Utilaje fără montaj:

Platforma armonica cu actionare electrica pentru lucrul la inaltime – 3 bucati

S-a semnat contractul de achiziție nr. 372 / 08.05.2012. Acestea au fost livrate și recepționate în data de 21.05.2012.

Platforma pentru lucrul la inaltime cu brat pliabil. – 1 bucata

S-a semnat contractul de achiziție nr. 373 / 10.05.2012. Conform contractului aceasta va fi livrată în luna Septembrie, dar ea va fi practic livrată în luna August.

Sursa mobila alimentare avioane – 1 bucata

S-a semnat contractul de achiziție nr. 374 / 17.05.2012. Conform contractului aceasta va fi livrată în luna Septembrie, dar ea va fi practic livrată în luna August.

Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală

Mai jos sunt prezentate activitățile obiectivului de lucru „Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală” aferente perioadei de raportare a prezentului raport trimestrial de progres, conform Actului adițional nr.2.

F98. Vopsitorie pardoseală hangar	Aprilie 2012 S1	Aprilie 2012 S4	Finalizat
F99. Platformă de acces în hangar, trotuar și rigole	Martie 2012 S1	Aprilie 2012 S4	Finalizat

In această perioadă s-au încheiat următoarele procese-verbale:

Proces-verbal etapa 17 / 19.04.2012 – iluminat, aer comprimat, alimentare portieră

Proces-verbal / 11.06.2012 - telefonie / calculatoare

Proces-verbal etapa 18 / 15.06.2012 – vopsire pardoseală, platformă exterioară

Proces-verbal de punere în funcțiune 107 / 19.06.2012 – instalație încălzire cu aer cald cu centrală termică proprie și sistem cu tubulatură de ventilație

Proces-verbal de punere în funcțiune 108 / 19.06.2012 – instalație proprie de aer tehnologic cu rezervor, filtre, uscător / dezumidificator, rețea de distribuție.

Proces-verbal de punere în funcțiune 121 / 25.06.2012 – sistem semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendii.

Proces-verbal de punere în funcțiune 122 / 26.06.2012 – sistem de acționare portiere

Proces-verbal recepție lucrări 123 / 26.06.2012 – execuție lucrări exterioare

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire hangar fabricație și montaj aeronave civile” pentru lucrările proiectului „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente”: Proces-verbal nr. 124 din data de 29.06.2012.

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire platformă exterioară de lucru aferentă hangar pentru montaj și fabricație aeronave civile” Proces-verbal nr. 125 / 29.06.2012.

Până la momentul actual, prin acest proiect au fost angajate 19 persoane.

5.0. Măsurile corective

Raportul de progres nr.8 (perioada de raportare 23.01.2012 – 22.04.2012) a fost avizat cu următoarele mențiuni / recomandări pentru prezentul Raport de progres:

- Atașarea alături de activitatea de șantier pentru lunile Aprilie-Iunie 2012 a raportului aferent lunii Ianuarie 2012. În cazul în care lucrările au fost sistate pe parcursul lunii Ianuarie din cauza timpului geros, se va trimite către Autoritatea de Management documentele care atestă perioada de timp pentru care lucrările au fost întrerupte (ex.: Scrisoarea Dirigintelui de șantier către Contractorul lucrărilor sau Scrisoarea Contractorului lucrărilor către Beneficiar / Diriginte etc.);
- Detalierea la pct. 5.3. „Aspecte legate de mediu” modul în care au fost îndeplinite angajamentele de mediu asumate prin cererea de finanțare.

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Contractul de finanțare:

Activitatea Nr.	Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare	Data de începere a activității planificate	Data finală a activității planificate
Activitatea 1	Achiziții de mașini-unelte	23.09.2011	22.05.2012
Activitatea 2	Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	23.03.2012	22.06.2012
Activitatea 3	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	23.09.2010	22.09.2012
Activitatea 4	Achiziții de: b) Utilaje fără montaj	23.06.2012	22.09.2012
Activitatea 5	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)	23.09.2010 23.05.2011 23.09.2011	22.09.2012 22.05.2012 22.07.2012

Graficul Gantt aferent perioadei de raportare a acestui Raport de progres:

Activitatea	Luna 25	Luna 26	Luna 27
Componentele: „Extinderea capacității de fabricație piese din tablă și subansamble de structură” și „Extinderea capacității de producție în sectorul prelucrări mecanice de aviație”			
Achiziții de mașini-unelte	■		
Componenta: „Crearea unei noi capacități de producție pentru realizarea de avioane cargo”			
Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	■	■	
Achiziții de:			
a) Kit metalic hangar, lucrări de construcții și utilități	■	■	■
b) Utilaje fără montaj			■
Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală			
d) Montaj hangar	■		
e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)	■	■	■

Nr. Activitate	Activități desfășurate în timpul perioadei de raportare	Data de începere a activității desfășurate	Data finală a activității desfășurate
Activitatea 1	Achiziții de mașini-unelte	23.09.2011	01.06.2012
Activitatea 2	Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	23.03.2012	22.06.2012
Activitatea 3	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	23.09.2010	29.06.2012
Activitatea 4	Achiziții de: c) Utilaje fără montaj	23.06.2012	22.09.2012
Activitatea 5	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)	23.09.2010 23.05.2011 23.09.2011	29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012

5.2. Rezultatele obținute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):

1. Rezultatul (Obiectul contractului)	2. Date de identificare. Contract achiziție/ Valoare (lei)	3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare	4. Nr. contracte semnate până în prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finanțare)
Achiziție presă de îndoit tabla ABKANT CNC (1 buc.)	952 / 29.06.2010 30.000 €	0	1
Achiziție mașină de îndoit / roluit conducte CNC (1 buc.)	67.000 €	0	
Achiziție mașină de frezat CNC 4 axe (1 buc.)	953 / 05.07.2010 122.864 USD	0	1
Achiziție strung CNC (1 buc.)	020 / 09.07.2010 132.000 €	0	1
Achiziție mașină de frezat CNC rataj 3 axe (1 buc.)	955 / 13.07.2010 303.096 €	0	1
Achiziție 1 pachet Software CAD Achiziție 3 pachete Software CAM	777 / 23.07.2010 45.000 €	0	1
Servicii de instruire CATIA V5 Basics	1017 / 18.08.2010 4.850 €	0	1
Achiziție produs „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente”	22615 / 11.10.2010 11.100.000 lei	0	1
Echipament de măsură 3D	110630-TC-101393-1 / 31.08.2011 98.327 €	0	1
Achiziție Masina de frezat CNC in 4 axe (1 buc.)	957 / 05.09.2011 198.800 €	0	1
Achiziție Echipament de sudura (2 buc.)	955 / 31.08.2011 2 x 6052 € Act adițional nr. 1 la Contractul de achiziție 955 / 31.08.2011	0	1
Mașină de marcat cu jet de cerneală (1 buc.)	954 / 26.08.2011 15.540 € Act adițional nr.1 la Contractul de achiziție 954 / 26.08.2011	0	1
Strung CNC (1 buc.)	958 / 06.09.2011 159.000 €	0	1
Mașină de frezat CNC 5 axe (1 buc.)	959 / 13.09.2011 287.200 €	0	1
Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.)	960 / 29.09.2011 38.600 €	0	1

Mașină de ascuțit scule CNC (1 buc.)	961 / 03.10.2011 70.000 €	0	1
Sursă mobilă alimentare avioane (1 buc.)	374 / 17.05.2012 55.000 €	1	1
Platformă armonică cu acționare electrică pentru lucrul la înălțime (3 buc.)	372 / 08.05.2012 71.160 €	1	1
Platformă pentru lucrul la înălțime cu braț pliabil (1 buc.)	373 / 10.05.2012 47.622,24 €	1	1

Procesele-verbale de predare-primire mașini-unelte:

Strung CNC: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 08.12.2010

Presă de îndoit tablă abkant CNC: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 10.02.2011

Mașina de îndoit / roluit conducte: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 10.02.2011

Mașina de frezat CNC 4 axe: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 03.03.2011

Mașina de frezat CNC rutaj 3 axe: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 06.04.2011

Mașina de marcat cu jet de cerneală: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 23.09.2011

Echipament de sudură (2 buc.): Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 24.10.2011

Presă de îndoit tablă abkant: Proces-verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 21.12.2011

Mașină de ascuțit scule: Proces verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 26.01.2012

Echipament de măsură 3D: Proces verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 28.03.2012

Strung CNC: Proces verbal de predare-primire și punere în funcțiune din data de 07.03.2012

Mașină de frezat CNC în 4 axe: Proces-verbal de punere în funcțiune din data de 17.05.2012

Mașină de frezat CNC N 5 axe: Proces-verbal de punere în funcțiune din data de 01.06.2012

Procese-verbale de predare-primire Utilaje fără montaj:

Platformă armonică cu acționare electrică pentru lucrul la înălțime: Proces-verbal din data de 21.05.2012

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire hangar fabricație și montaj aeronave civile” pentru lucrările proiectului „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente”: Proces-verbal nr. 124 din data de 29.06.2012.

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire platformă exterioară de lucru aferentă hangar pentru montaj și fabricație aeronave civile” Proces-verbal nr. 125 / 29.06.2012.

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

Prin Cererea de finanțare, S.C. AEROSTAR S.A. și-a asumat răspunderea de mediu pe principiul „poluatorul plătește” în scopul prevenirii și reparării prejudiciului adus mediului, conform O.U.G. nr. 68/2007 ce transpunea prevederile Directivei Europene 200/35/CE.

Actualmente, Societatea are Autorizație Integrată de Mediu (I.P.P.C.) pentru întregul amplasament (25 / 07.08.2066, revizuită în 12.06.2012, cu valabilitate până la 29.12.2017), care presupune supravegherea integrată a tuturor factorilor de mediu. Această Autorizație Integrată de Mediu este conform cu Directiva U.E. 2012/75/UE – Prevenirea și controlul integrat de Mediu. Anual, Biroul de Mediu din cadrul S.C. AEROSTAR S.A. înaintează Rapoartul Anual de Mediu către Agenția Regională de Protecția Mediului.

Sistemul Managerial de Mediu este certificat conform ISO 14001:2004, ceea ce creează un cadru de tratare unitar al acțiunilor de protejarea mediului.

Activitatea 1	Activitatea 2	Activitatea 3	Activitatea 4	Activitatea 5
Achiziții de mașini-unelte	Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	Achiziții de: b) Utilaje fără montaj	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)
In „Documentația de atribuire aferentă contractului de achiziție: Mașini unelte și echipamente”, la cap. I – Fișa de date a achiziției”, punctul V.5. Standarde de protecția muncii și protecția mediului există o cerință de a completa o declarație pe propria răspundere (Formularul nr.6 din cap II. Formulare), prin care agentul economic se angajează ca la elaborarea ofertei să țină cont de Normele europene referitoare la protecția mediului.	In „Documentația de atribuire aferentă contractului de achiziție: Utilaje fără montaj pentru lucrări desfășurate în hangar”, la punctul V.5. Standarde de protecția muncii și protecția mediului, ofertantul i se cere să completeze o declarație pe propria răspundere (Formularul nr.6) prin care acesta certifică faptul că la elaborarea ofertei s-a ținut cont de Normele Europene referitoare la Protecția Mediului.	In contractul de achiziție a produsului „kit metalic hangar” este specificat că „Furnizorul se va angaja să respecte Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului adus acestuia.	Utilajele fără montaj ce urmează a fi achiziționate vor respecta Normele Europene referitoare la Protecția mediului. (conform pct. V.5. din Contractele de achiziție).	Lucrările de construcții, execuție racorduri exterioare și montajul kitului metalic al hangarului se vor executa astfel încât să nu afecteze acum și pe viitor mediul înconjurător. In contractul nr. 22615 / 11.10.2010 dintre S.C. AEROSTAR S.A. Bacău și SC. SSAB-AG. S.R.L., la cap. 7. Obligațiile principale ale executantului există art 7.6, pct. iii., prin care executantul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

5.4. Aspecte privind egalitatea de șanse (respectarea principiului în atribuirea contractului de achiziție; precum și informații cf. Cererii de finanțare)

În ceea ce privește aplicarea principiului **egalității de șanse pentru încheierea contractelor de achiziții și servicii** se respectă și aplică Normele interne de achiziție (Anexa VI din Ghidul solicitantului) și se au în vedere:

1. *Nediscriminare și tratament egal.* S-au avut în vedere asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.
2. *Recunoașterea reciprocă.* S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piața Uniunii Europene, a diplomelor și certificatelor, a altor documente emise de autoritățile competente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național.
3. *Transparența.* Reprezentanții ofertanților au fost informați despre procedura de atribuire, documentația de atribuire, oportunitatea de participare la achiziții și la desemnarea rezultatului procedurii.
4. *Asumarea răspunderii.* S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței.

Activitatea 1	Activitatea 2	Activitatea 3	Activitatea 4	Activitatea 5
Achiziții de mașini-unelte	Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	Achiziții de: a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități”	Achiziții de: b) Utilaje fără montaj	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)
Achiziția de Mașini-unelte și echipamente s-a desfășurat respectând: - Legislația privind Egalitatea de șanse, și anume, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu	Această activitate s-a desfășurat respectând: - Legislația privind Egalitatea de șanse, și anume, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,	Această activitate este o componentă a produsului „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente” și se desfășoară respectând: - Legislația privind Egalitatea de șanse, și anume, Ordonanța	Această activitate se desfășoară respectând: - Legislația privind Egalitatea de șanse, și anume, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu completările ulterioare;	Această activitate este o componentă a produsului „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente” și se desfășoară respectând: - Legislația privind Egalitatea de șanse, și anume, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

<p>completările ulterioare;</p> <p>- obligațiile din Anexa VII – Norme interne de achiziții – Ghidul solicitantului;</p> <p>- obligațiile din Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.</p>	<p>republicată cu completările ulterioare;</p> <p>- obligațiile din Anexa VII – Norme interne de achiziții – Ghidul solicitantului;</p> <p>- obligațiile din Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.</p>	<p>Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu completările ulterioare;</p> <p>- obligațiile din Anexa VII – Norme interne de achiziții – Ghidul solicitantului;</p> <p>- obligațiile din Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.</p>	<p>- obligațiile din Anexa VII – Norme interne de achiziții – Ghidul solicitantului;</p> <p>- obligațiile din Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.</p>	<p>discriminare, republicată cu completările ulterioare;</p> <p>- obligațiile din Anexa VII – Norme interne de achiziții – Ghidul solicitantului;</p> <p>- obligațiile din Cap. Egalitatea de șanse din Cererea de Finanțare.</p>
--	---	--	--	---

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)

Activitatea Nr.	Descrierea problemelor	Soluția/ propunere	Condiții
Activitatea nr.1 Achiziții de mașini-unelte	Mașina de frezat CNC 5 axe (DMG) avea termen de livrare 22 Martie 2012.	Conform contractului, vânzătorul trebuie să plătească o penalitate de 0,5 % / săptămâna de întârziere din valoarea contractului. Aceasta a fost livrată cu o întârziere de 7 săptămâni, penalizarea regăsindu-se în factura nr. 0040669 / 27.06.2012, emisă de S.C. AEROSTAR S.A., în valoare de 10.052 €	-
Activitatea nr. 2 Licitații în vederea achiziționării de: b) Utilaje fără montaj	-	-	-
Activitatea nr. 3 Achiziții de: Kit metalic hangar lucrări de construcții montaj și utilități	-	-	-
Activitatea nr.4 Achiziție de: utilaje fără montaj	-	-	-
Activitatea nr. 4 Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aeroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri)	-	-	-

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiționate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării	Descrierea modificării	Motivația
-	-	-

5.7. Specificații stadiul achizițiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF

Nr. contract	Obiectul contractului	Valoarea contractului (lei)	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul achiziției publice
Comanda nr. 17972 / 25.05.2010	Achiziție: -PANOU AFISAJ TEMPORAR (2 buc.) -BANNER PRINTAT (2 buc.)	1.834,80 Lei 133,44 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 17992 / 11.06.2010	Achiziție: -pliant (200 buc.) -autocolant (50 buc.)	336,00 Lei 84,00 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 304 / 06.05.2010	Anunț machetă în ziarul Bursa referitor la proiect	2.481,22 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Comandă nr. 17974 / 25.05.2010	Anunț Radio Alfa Bacău cu privire la proiect	15,40 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 952 / 29.06.2010	Achiziție: -PRESA DE INDOIT TABLA ABKANT (1 buc.)	DDU 30.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
	-MASINA DE INDOIT / ROLUIT CONDUCTE CNC (1 buc.)	DDU 67.000 €				FINALIZAT

Contract 953 / 05.07.2010	Achiziție: -MASINA DE FREZAT CNC 4 AXE (1 buc.)	DDU 122.864 USD	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 020 / 09.07.2010	Achiziție: -STRUNG CNC (1 buc.)	CIP Bacău 132.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract 955 / 13.07.2010	Achiziție: -MASINA DE FREZAT CNC RUTAJ 3 AXE (1 buc.)	CIP Bacău 303.096 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 777 / 23.07.2010	Achiziție: -1 Pachet software CAD -3 Pachete software CAM	45.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 1017 / 18.08.2010	Achiziție: Servicii de instruire CATIA V5 Basics	4.850 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 22615 / 11.10.2010	Achiziție: Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente.	11.100.000 Lei	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 110630- TC-101393-1 / 31.08.2011	Achiziție: Echipament de măsură 3D (1 buc.)	98.327 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 957 / 05.09.2011	Achiziție: Mașină de frezat CNC în 4 axe (1 buc.)	198.800 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 955 / 31.08.2011. Act adițional nr. 1 la contract nr. 955 / 31.08.2011	Achiziție: Echipament de sudură (2 buc.)	2 x 6052 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 954 / 26.08.2011. Act adițional nr.1 la contract nr. 954 / 26.08.2011	Achiziție mașină de marcat cu jet de cerneală (1 buc.)	15.540 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT

Contract nr. 958 / 06.09.2011	Achiziție strung CNC (1 buc.)	159.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 959 / 13.09.2011	Mașină de frezat CNC 5 axe (1 buc.)	287.200 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 960 / 29.09.2011	Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.)	38.600 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 961 / 03.10.2011	Mașină de ascuțit scule CNC (1 buc.)	70.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 372 / 08.05.2012	Platformă armonică cu acționare electrică pentru lucrul la înălțime (3 buc.)	71.160 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	FINALIZAT
Contract nr. 373 / 10.05.2012	Platformă de lucru la înălțime cu braț pliabil (1 buc.)	47.622,24 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare
Contract nr. 374 / 17.05.2012	Sursă mobilă alimentare avioane (1 buc.)	55.000 €	Norme interne de achiziție	Procedură închisă	Procedură închisă	In curs de desfășurare

6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință (trimestru)		Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat la data începerii proiectului)	
	U.M. (2)	Cantitate (3)	U.M. (4)	Cantitate (5)	U.M. (6)	Cantitate (7)
Indicatorii de realizare (1)						
Active tangibile achiziționate prin proiect	Buc.	20	Buc.	7	Buc.	19
Active intangibile achiziționate prin proiect	Buc.	4	Pachet Software	0	Pachet Software	4
Suprafața de producție modernizată / construită prin proiect	m ²	5.200	m ²	5.200 *	m ²	5.200

(*) Pentru atingerea obiectivelor proiectului s-au obținut două autorizații de construire:

- a) Autorizație de construire nr. 341 din 29.12.2010 pentru „Lucrări de construire – Hangar pentru montaj și fabricația aeronavelor civile”;
- b) Autorizație de construire nr. 131 din 01.07.2011 pentru „Lucrări de construire - Platformă exterioară de lucru aferentă Hangar pentru montaj și fabricație aeronave civile”

Recepția la terminarea lucrărilor, conform autorizațiilor menționate s-a făcut cu:

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire hangar fabricație și montaj aeronave civile” pentru lucrările proiectului „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente”: Proces-verbal nr. 124 din data de 29.06.2012.

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea „Construire platformă exterioară de lucru aferentă hangar pentru montaj și fabricație aeronave civile” Proces-verbal nr. 125 / 29.06.2012.

Conform Anexa 13 la Contractul de finanțare – Lista achizițiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului, la pozițiile 13 și 14, se regăsesc:

- Instalație încălzire cu aer cald cu centrală termică proprie și instalație cu tubulatură de ventilație;
- Instalație proprie de aer tehnologic cu rezervor filtre, uscător / deumificator, rețea de distribuție.

Aceste două instalații fac parte din categoria indicatorilor de proiect după semnarea Contractului de finanțare cu Autoritatea de Management. Cele două instalații fac parte din produsul ce a fost licitat și este în perioada de realizare: „Proiectare, execuție kit metalic hangar și instalațiile acestuia. Lucrări de construcție, montaj și utilități aferente.”. Acestea s-au regăsit în Caietul de sarcini la Capitolul B. Proiectare și execuție instalații.:

B2. Instalații termice. Confortul termic al hangarului se obține de la o sursă termică proprie care a fost denumită: Instalație de încălzire cu aer cald cu centrală termică proprie și instalație cu tubulatură de ventilație”

B3. Instalație proprie de aer comprimat.

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da

Nu

Conform RC 1083 / 2006 , art. 55, în această fază, proiectul nu este generator de venituri.

8. Planul de lucru. Completați cu Activitățile desfășurate / previzionate și rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

Nr. crt.	Activitățile desfășurate în perioada de raportare (data de începere și de finalizare)	Activitățile preconizate a fi desfășurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere și de finalizare) conform Contractului de finanțare	Rezultate previzionate
1.	Achiziții de mașini-unelte 23.04.2011-01.06.2012	-	S-au achiziționat toate mașinile-unelte.
2.	Licitații în vederea achiziționării de: b)Utilaje fără montaj 23.03.2012-22.06.2012	-	-
4.	Achiziții de: a) Kit metalic hangar, lucrări de construcții-montaj și utilități 23.04.2012-29.06.2012	-	-
6.	Construcții, racorduri exterioare, lucrări utilități, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: d) Montaj hangar 23.04.2012-29.06.2012 e) Lucrări utilități: termice (centrală termică), electrice, ventilație (tubulatură aéroterme), PSI (hidranți de interior, centrală de avertizare incendii), aer tehnologic (aer comprimat), anexă tehnică (de exterior), finisaje (remedieri) 23.04.2012-29.06.2012	- - -	- - -

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea indicatorului obținută de la ultima cerere de plată		Valoarea obținută până în prezent		% 8= (7)/(5)*100
	Cantitate (2)	Suma (Lei)(3)	Cantitate (4)	Suma (Lei) (5)	Cantitate (6)	Suma (Lei) (7)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Parte fizica n							
Total							

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declarația șefului de lucrări, Arhitect sau Inginer, care vor respecta specificațiile din tabelul de mai sus.
